

社会福祉法人 池上長寿園 御中

WEBサイトリニューアル プロジェクトの進め方ガイド

進め方編・ダッシュボード編・移行計画編の3部構成 / 2026年8月20日

株式会社インフォネット

〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル7F

制作・保守運用パートナー：株式会社ITLINE

INFONET

© infoNet inc. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

Contents

第1部 進め方編（スケジュール・役割分担）

- 04 プロジェクト運営の基本方針／Teams + Webダッシュボード
- 06 全体スケジュール／工程別の進捗表
- 08 貴法人にお願いする事項／写真撮影／記事・原稿
- 11 金額確定までの流れ／情報共有・進捗管理の運用ルール

第2部 進捗ダッシュボード編（画面のご紹介）

- 14 専用ダッシュボードの全体像／画面のみどころ①～③
- 18 ご利用方法（追加費用なし）

第3部 移行計画編（現行サイトからの移行）

- 20 移行の基本方針と対象
- 21 移行の5ステップ／リスクと対策
- 23 現行環境の調査結果と役割分担

PART 1

進め方編

全体スケジュール・役割分担・お願いする事項・金額確定までの流れ

プロジェクト運営の基本方針

初めてのリニューアルであることを前提に、進行管理と専門領域はすべて弊社側で担う体制を組んでいます。

進行管理は弊社が担当

各工程の段取り・スケジュール管理・品質管理は弊社が実施し、「次に行くこと」は毎回弊社からご案内します。貴法人側での進行管理業務は発生しません。

貴法人のご対応範囲を限定しています

貴法人にお願いする事項は、①各工程の節目での内容のご確認・ご承認、②記事・写真の元となる情報のご提供、③写真撮影の日程調整、の3点に限定しています。制作・技術作業はすべて弊社が担当します。

ご質問・ご相談はTeamsで随時受付

やりとりはTeams（チームス）のチャットを基本とします。ご不明点は随時ご投稿いただければ、会議を待たずに弊社が回答します。ご判断に必要な比較資料は毎回弊社がご用意します。

本書は「いつ・どちらが・何を行うか」を整理した進行ガイドです。次ページ以降で順にご説明します。

やりとりはTeams + Webダッシュボードで

やりとりはMicrosoft Teams（チームス）が基本。進捗は専用のWebダッシュボードでいつでもご覧いただけます。

Teams = プロジェクトの共有スペース

- ・経営企画課の皆さま・各施設・関係部署の皆さまが同じスペースに
参加でき、情報が一度で全員に届きます
- ・ご質問・ご意見はチャットで気軽に投稿 → 弊社がすぐ回答。
会議を待たずに物事が進み、レスポンスが速くなります
- ・やりとりがすべて記録に残るため「言った・言わない」がなく、
途中から参加された方も経緯をさかのぼって確認できます

Webダッシュボード = 進捗がひと目で分かる

- ・各工程の状況（完了／進行中／これから）を、
見たいときにいつでもご確認いただけます
- ・「いまご確認をお願いしている事項」が一覧で分かるので、
何を待たれているのか迷いません
- ・画面をそのまま印刷・共有して、上長の皆さまへのご報告や
施設内での情報共有にお使いいただけます


窓口ご担当者さまの調整業務を、ツールで効率化します。

部署間の情報集約・伝達・進捗確認にかかる工数を、Teamsとダッシュボードの併用で削減します。

Teamsは弊社でご用意し、使い方も最初にご案内します。公開後のサポート窓口も同じTeamsをそのまま使い続けられます。

全体スケジュール（2026年10月～2027年4月）

2026年10月のキックオフから2027年4月1日の公開まで、6ヶ月＋余裕を持った工程です。帯の色＝おもに動く側（紺＝弊社、オレンジ＝貴法人にもご協力いただく期間）です。

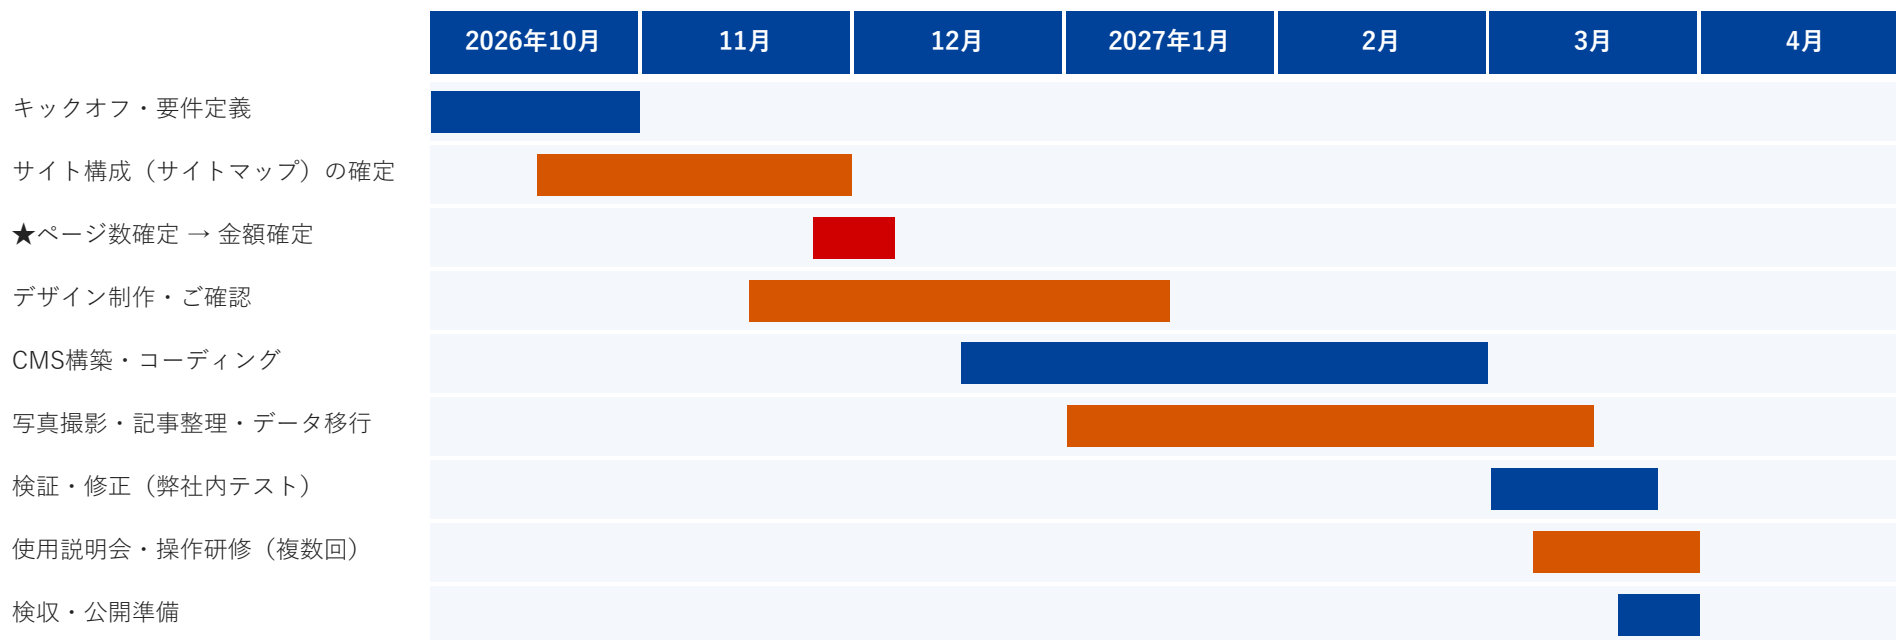

▼ 4月1日 公開

凡例 | 紺＝弊社が作業する工程 オレンジ＝貴法人のご確認・素材のご協力をいただく工程 赤＝金額確定のタイミング

※ 各月の詳細スケジュールは、キックオフ時に確定版をお渡しし、毎月の定例で更新します。

工程別の進捗表（どちらが・何を・いつ）

各工程で「弊社が行うこと」「貴法人にお願いすること」を分けて一覧にしました。この表がそのまま進捗管理表になります。

#	工程（時期）	弊社が行うこと	貴法人にお願いすること
1	キックオフ （10月）	進め方・体制・連絡方法のご説明、詳細スケジュールの確定	キックオフ会議へのご出席（1～2時間）
2	サイト構成の確定 （10～11月）	サイトマップ案の作成・修正、ページ数の算出、確定金額のご提示	サイトマップのご確認・ご承認（載せたい内容の追加・削除のご指示）
3	デザイン （11～1月）	トップ・下層デザインの制作、修正対応	デザインのご確認・ご承認（2～3回）
4	構築・コンテンツ （12～3月）	CMS構築、既存156P・記事286件の移行、写真撮影、新規ページの原稿整理	写真撮影の日程調整、新規ページの元情報のご提供、原稿のご確認
5	検証・研修 （2～3月）	全ページの表示・動作検証、使用説明会（複数回）、PDFマニュアル納品	検証サイトのご確認、説明会へのご参加
6	公開 （3月末～4/1）	公開作業・DNS切替のご案内・公開後の集中監視	検収のご承認、DNS変更操作（手順書どおり・弊社立会い）

※ 「お願いすること」はいずれも確認・ご出席・元情報のご提供のみです。制作作業・技術的な作業は発生しません。

※ 各工程の進捗状況は、Webダッシュボードでいつでもご確認いただけます（次の定例を待つ必要はありません）。

貴法人にお願いする事項（3項目）

6ヶ月間を通じて貴法人にお願いする事項は、次の3項目です。これ以外の作業はすべて弊社が実施します。

1

節目での「ご確認・ご承認」

サイトマップ・デザイン・原稿・検証サイトの各節目で内容をご確認いただき、「これで進めてよい」のご承認をいただきます。判断に迷わないよう、毎回比較材料と推奨案を添えてご提示します。ご確認・ご承認はTeams上のご返信で完結できます。

2

記事・原稿の「元情報」のご提供

新規ページ（職種紹介・先輩の声など9ページ）の元になる情報をご提供ください。箇条書きのメモ、またはヒアリングへのご対応で結構です。文章化・ページ化は弊社が行います。既存の156ページ・記事286件は弊社がそのまま移行します。

3

写真撮影の「日程調整」

撮影は弊社が実施します（次ページ参照）。貴法人には撮影日の調整と、撮影に写るご利用者様・職員の方への事前のご了承の取り付けをお願いします。

DNS切替の操作（公開直前・1回のみ）は管理権限の関係で貴法人の操作となりますが、手順書と弊社立会いのもとで行います。

写真撮影について（お見積りに含まれます）

デザインの質を大きく左右する写真は、プロ撮影で新しくご用意します。撮影費用は御見積書に含まれています。

回数・時間	1回・2時間（各施設のご担当者さまと調整のうえ撮影日を決定します）
カット数	制限なし（時間内で撮影できるカットはすべて納品します）
著作権	撮影データの著作権は貴法人に譲渡します。サイト以外（パンフレット・広報誌等）にも自由にお使いいただけます
撮影内容	施設の外観・内観、サービス風景、職員の方の働く様子など（採用ページの「先輩の声」用ポートレートも同日に撮影可能）
費用	御見積書に含まれています（追加のご請求はありません）

貴法人にお願いしたいこと

・撮影日のご調整（各施設との日程・場所の確保） ・写り込むご利用者様・職員の方への事前のご了承

※ 2回目以降の追加撮影をご希望の場合は、別途お見積りとなります。

記事・原稿のご用意について

原稿の新規作成は最小限です。既存ページ・記事は弊社がすべて移行し、新規9ページ分の元情報のみご提供をお願いします。

弊社が行うこと（ご用意不要）

- ・ 既存156ページの文章・画像の移行と再構成
- ・ お知らせ・行事などの記事データ286件の全件移行
- ・ 求人票データの全件移行
- ・ 文章の整理・リライト（古い表現・重複の整理）
- ・ 移行時の表示崩れの修正

ご提供をお願いするもの（新規9ページ分のみ）

- ・ 職種紹介：各職種の仕事内容が分かるメモ（箇条書きで可）
- ・ 先輩職員の声：ご登場いただける職員の方のご推薦
（お話の聞き取り・文章化は弊社が行います）
- ・ 教育研修・福利厚生：現行の制度資料（既存の紙資料で可）
- ・ ご利用の流れ・料金：現行の料金表・重要事項説明書

ご提供いただくのは元情報のみ。構成・文章化・ページ化は弊社が担当します。

進め方 | 工程4（12月～）の始めに「ご提供いただきたいもののリスト」をTeamsで共有します。ご準備は少しずつで構いません。ファイルの受け渡しもTeams上で行えます。

期限に間に合わない項目があっても、公開後に追加できる設計にするため、公開スケジュールには影響しません。

お見積り金額が確定するまでの流れ

現在の御見積書は「現行の全156ページを移行する場合」の金額です。ページ数の確定をもって正式金額を確定します。



ページが減った場合

- ・御見積書は「ページ単価 × ページ数」の明細式です
- ・サイト構成の検討で「このページは統合しよう・やめよう」となった場合は、減った分だけ金額も下がります
- ・確定金額は明細付きで再提示し、ご承認後に着手します

ページが増えた場合

- ・新しく作りたいページが増えた場合は、事前に「1ページあたりの単価」で追加分をご提示します
- ・事前のご提示とご承認なしに費用が発生することはありません

金額が動くのは「ページ数が変わったとき」に限られます。変わる前に必ずご相談し、ご承認なしに費用が変わることはありません。

情報共有・進捗管理の運用ルール

Teams・Webダッシュボード・月次定例の3つを組み合わせ、情報共有と進捗管理を運用ルールとして定着させます。

Teams：随時の連絡・共有

ご質問・ご相談・ファイルの受け渡しはTeamsで随時行います。関係部署の皆さまが同一の情報を同時に参照できるため、個別の転送・伝達作業が発生しません。

ダッシュボード：進捗の可視化

本書P6・P7の工程表と連動し、各作業の状況（完了／進行中／これから）を常に最新の状態に更新します。社内でのご報告資料としてもそのままご利用いただけます。

月次定例と議事録

月1回の定例ミーティングで進捗と翌月の予定をご報告し、決定事項は議事録としてTeamsに掲示します。オンライン・ご来訪のいずれでも開催可能です。

公開後のサポートも同じTeams・同じ窓口で継続します。プロジェクトと同じ体制のまま、運用フェーズへ移行します。

PART 2

進捗ダッシュボード編

貴法人専用に開発する進捗ダッシュボードの画面と使い方をご紹介します

▶ 動く画面イメージ（サンプルデータ）は、こちらからご覧いただけます

池上長寿園様 進捗ダッシュボード（デモページを開く）

<https://itline-kodama.github.io/share-o0ygn0909we6mv/d.html>



QRコードからも

池上長寿園様専用の進捗ダッシュボード

ブラウザで専用URLを開くと、プロジェクトの「いま」がすべて分かる画面です。貴法人専用開発してご提供します。



▲ ダッシュボード全体（PC画面）

状況確認の手間を削減

現在の工程・進捗・ご確認事項を、お問い合わせいただくことなく画面上でご確認いただけます。最終更新日時を明記し、常に最新の状態を保ちます。

部署を横断した情報共有

専用URL＋パスワードにより、経営企画課の皆さま・各施設・上長の皆さままで同じ画面を参照でき、進捗の認識を統一できます。


更新依頼もダッシュボードから

公開後の更新のご依頼とやり取りは、専用の更新依頼ダッシュボードから行えます。メール・お電話・貴法人ご希望のツールと併用いただけます。

画面は左のとおり1ページ完結の構成。マニュアルを参照することなく、直感的にご確認いただけます。

画面のみどころ① ガントチャートで全体を把握

画面の中心はガントチャート。「どの工程を・誰が担当し・どこまで進んだか」が、この1枚に集約されています。

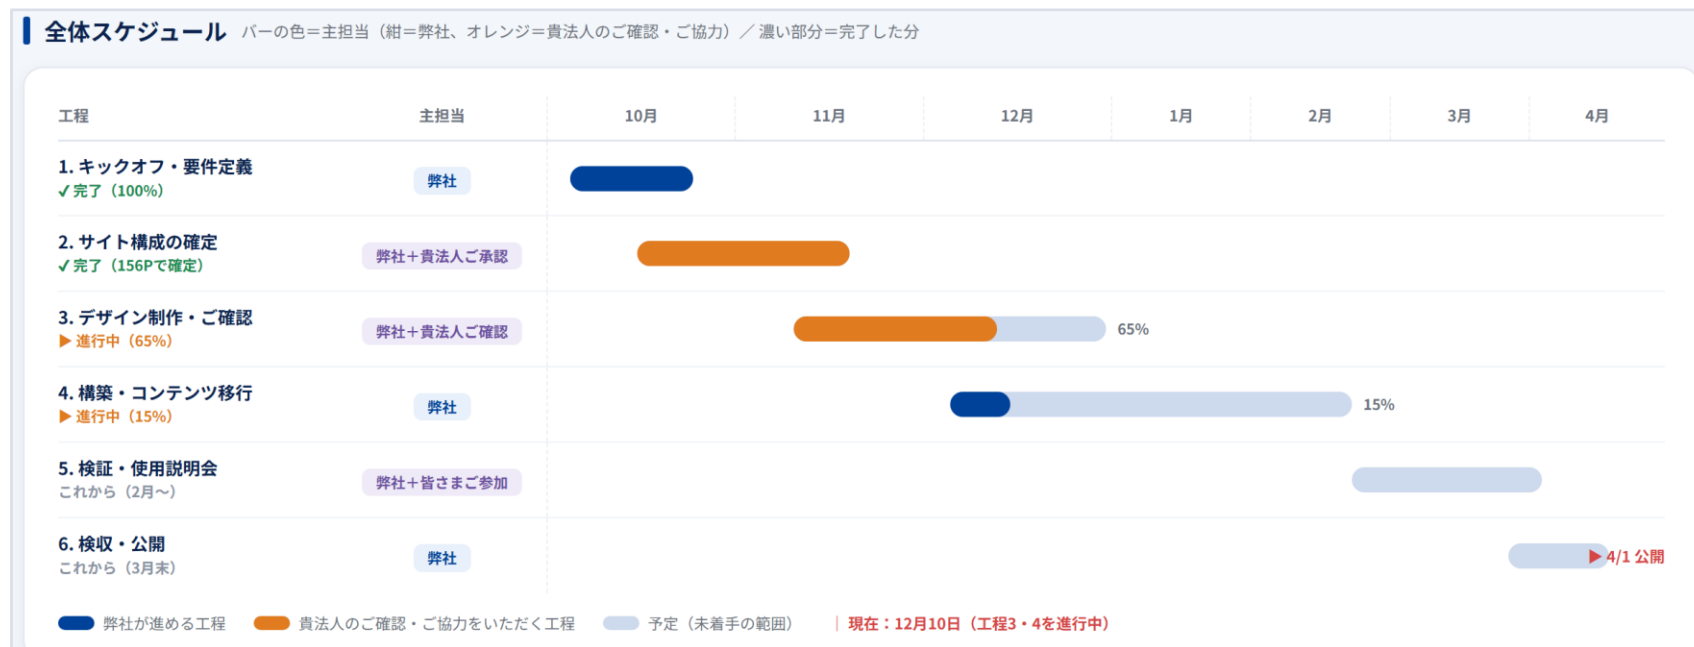

▲ 全体スケジュール（ガントチャート）：工程×月のバー+主担当+進捗率

ここが便利

- ・バーの色で担当がひと目：紺＝弊社が進める工程、オレンジ＝貴法人のご確認・ご協力をいただく工程
- ・バーの濃い部分＝完了した分。「いまどこまで来たか」が塗りの長さで直感的に分かります
- ・各工程の右に進捗率と状況（完了／進行中／これから）を明記。会議資料にそのまま使えます

画面のみどころ② 対応主体と期限の明確化

ご対応をお願いしている事項と、弊社側で進行中の作業を分けて表示します。対応主体と期限が常に明確になります。

ご対応をお願いしたいこと 担当：池上長寿園様

池上長寿園様をお願いしている事項		2件
12/16(水) まで	下層ページデザインのご確認・ご承認 Teamsに比較画像を掲示済み。チャットのご返信で完結します	貴法人
12/22(火) まで	「職種紹介」ページの元情報メモのご提供 箇条書きで十分です。ひな形をTeamsに置いています	貴法人

※ この2件のご対応があれば、そのほかはすべて弊社側で進みます。

▲ 池上長寿園様をお願いしている事項（期限つき・担当バッジ）

弊社がいま進めていること 担当：インフォネット／ITLINE

弊社側で進行中の作業		3件
～12/24	下層ページデザインの制作（残り12テンプレート） 担当：ITLINE デザイナー	弊社
～1月中旬	既存記事286件の移行・表示チェック 担当：ITLINE エンジニア	弊社
～1月末	求人検索データベースの機能構築 担当：ITLINE エンジニア	弊社

※ 進み具合は上のスケジュールのバーに反映されます。ご質問はTeamsへどうぞ。

▲ 弊社側で進行中の作業（期限・担当者つき）

ここが便利

- ・ オレンジ＝貴法人のご対応事項、紺＝弊社の作業。対応主体が色とバッジで判別できます
- ・ 貴法人へのご依頼は期限つきで必要最小限に絞り、ご対応後は一覧から消えるため未対応事項の見落としを防げます
- ・ 弊社側の作業も担当者名（デザイナー／エンジニア）まで開示。進み具合は上のガントチャートに反映されます

画面のみどころ③ 直近の予定と、これまでの記録

「次に何があるか」と「これまでに何が決まったか」も、同じ画面で確認できます。

直近の予定

12/15
火

第3回 定例ミーティング
15:00～15:45 オンライン | ご出席：両者

12/24
木

下層デザイン修正版のご提示
Teamsに掲示 | 担当：弊社

1/8
金

移行ページの確認用URLのご案内
検証環境を発行 | 担当：弊社

これまでの記録

決定事項・共有の履歴

12/08 (火)

決定

トップページデザイン (A案ベース・明るいトーン) をご承認いただきました。

12/02 (水)

共有

CMSサーバー環境の構築が完了。既存記事の移行テストを開始しました。

11/27 (金)

決定

ページ数156Pで確定 → 確定御見積書をご承認いただきました。

11/25 (水)

共有

第2回定例の議事録をTeamsに掲示しました。

▲ 直近の予定（担当つき）と、決定事項・共有の履歴

ここが便利

- ・ 直近の予定には担当（弊社／両者）を明記。定例やご提示物の予定が並び、日程の見通しが立ちます
- ・ 「決定」「共有」のタグつきで履歴が残るため、会議に出ていない方や途中参加の方への説明がスムーズです
- ・ デザインのご承認・金額の確定などの節目がすべて記録され、あとから「言った・言わない」になりません

ご利用方法（追加費用なし）

アプリのインストールは不要。パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで専用URLを開いてご覧いただけます。

ブラウザで専用URLを開く

貴法人専用のURLとパスワードをお渡しします。ブックマークしておけば、いつでも1クリックで最新の状態をご覧いただけます。

スマートフォン対応

画面はスマートフォンでも見やすく最適化。移動中や施設内でも、ポケットから進捗を確認できます（右の画面イメージ）。

更新は弊社が実施

定例・作業の節目ごとに弊社が更新します（最終更新日時を明記）。貴法人側で入力・操作していただくことはありません。

追加費用はありません

ダッシュボードの開発・運用はプロジェクト費用に含めてご提供します。公開後の保守期間中も、サポートの窓口情報とあわせて継続します。

▶ 動く画面イメージ（サンプルデータ）：<https://itline-kodama.github.io/share-o0ygn0909we6mv/d.html>



▲ スマートフォン表示

本資料の画面はサンプルデータによる開発イメージです。キックオフ時に、貴法人の実データで運用を開始します。

PART 3

移行計画編

現行サイトからの移行方針・工程・リスク対策（現行環境の調査は完了済み）

移行の基本方針と対象

現行サイトを止めることなく、2027年4月1日に確実に切り替えます（現行CMS・サーバは弊社が提供・保守）。

安全第一

現行サイトは公開したまま新環境を並行構築。
切替はDNSの向き先変更のみで、旧環境を温
存し即時切戻しが可能です。

全件移行

コンテンツ156ページ・記事データ286件・求
人検索データベースを全件移行し、移行漏れ
は全ページ照合リストで検出します。

検証優先

公開前にステージング環境で全ページの表
示・リンク・フォーム動作を検証し、ご確認
完了後にのみ切替を実施します。

移行対象	規模	移行方法の方針
コンテンツページ	156ページ	新サイトの共通テンプレートへ再構成して全件移行
記事データ（お知らせ・行事等）	286件	CMS記事としてインポート（お知らせ103件・行事等170件・その他13件）
求人検索データベース	機能＋全データ	カスタム投稿＋絞り込み検索で現行機能を再現し、求人票データを全件移行
フォーム（採用応募・問合せ）	2種	自動返信・データ保存・CSV出力を含め同等機能を再現
PDF・画像素材	一式	主要PDFはWebページ化。元データ（Word/Excel等）は保有分のみご提供をお願いします
ドメイン・SSL	ikegami.or.jp	現行ドメインを継続利用。DNSはエックスサーバー（権限は貴法人ご保有）

移行の5ステップ（どちらが・何を）

移行は5つのフェーズで管理します。現行データの抽出・受け渡しは、弊社と制作パートナー（ITLINE）の間に完結します。

#	フェーズ（時期）	弊社が行うこと	貴法人にお願いすること
1	現行環境の確定 （10月）	現行CMS（infoCMS）からのデータ抽出仕様の確定／移行対象・Webページ化対象の切り分け／全ページ照合リストの確定	移行対象ページの要否ご判断のみ
2	データ抽出・変換 （12～1月）	現行CMSのデータは、提供元である弊社（インフォネット）が直接エクスポートし、制作チームへ受け渡します。記事286件・求人票データの形式変換・インポート、内部リンク等の変換を実施	データのご用意は不要です（抽出・受け渡しは弊社と制作パートナーの間に完結）。PDFの元データのみ、保有分のご提供をお願いします
3	ステージング検証 （1～2月）	検証環境で全ページの表示・動作確認／旧URL→新URLの301リダイレクト設計／フォーム送信・自動返信の試験	検証環境での内容ご確認（確認用URLを発行します）
4	DNS切替・公開 （3月末）	切替手順書・切戻し手順の事前共有／SSL証明書の事前発行／切替当日の疎通確認	DNSレコードの変更操作（手順書・弊社立会いのもと）／切替日時のご承認
5	公開後監視 （4月～）	公開後1ヶ月の集中監視（表示・404・フォーム）／GA4計測の確認／旧環境の計画的な廃止	お気づきの点のご連絡（サポート窓口で受付）

4月1日必達の工程設計：3月中旬までに検証を完了させ、切替日は「作業日」ではなく「確認日」として迎えます。

移行のリスクと対策

想定されるリスクには、あらかじめ対策を用意したうえで着手します。

想定リスク	対策
現行CMSからデータを取り出せない	現行CMS（infoCMS）は弊社製品のため、CSV／HTMLソースでのエクスポートが可能なことを確認済み。公開ページからの収集による代替手段も準備しています（サイト内全URL434件のクロール実績）
旧世代CMSの独自タグによる表示崩れ	抽出データを新テンプレート用に一括変換（タグ除去・見出し／表・内部リンクの正規化）したうえでインポートし、全ページを目視照合します
求人検索データベースの互換性	カスタム投稿＋絞り込み検索で現行機能を再現し、移行後に現行サイトと検索結果を突き合わせて検証します
移行漏れ・ページの欠落	実測に基づく全ページ照合リストで新旧サイトを1ページずつ突き合わせ、公開前に全件検収します
DNS切替の失敗・切替後の不具合	切戻し手順を事前共有し、旧環境を温存。万一の際はDNSを戻すだけで旧サイトへ即時復旧できます
検索順位・被リンクの毀損	旧URL→新URLの301リダイレクトを全ページ分設計し、検索評価とブックマークを引き継ぎます
現行データの抽出・変換・登録の費用は御見積に含まれており、移行を理由とした追加のご請求は発生しません。	

現行環境の調査結果と役割分担

現行環境は弊社が提供・保守しているため、調査は社内で完了しています。移行の役割分担は以下のとおりです。

項目	調査結果
現行CMS	infoCMS（弊社製）。データはCSV／HTMLソースでエクスポート可能
現行サーバ	弊社提供の冗長化ホスティング（日次バックアップ・WAF運用中）
フォーム	CMS内で完結。受信データはCSVで書き出し、新サイトへ引き継ぎ可能
求人情報	CMSの商品DBモジュールで管理。外部システム連携なし
ドメイン・DNS	エックスサーバーで管理。変更権限は貴法人がご保有

担当	役割
インフォネット	プロジェクト統括・お客様窓口／現行環境の提供元として、現行データのエクスポートと環境情報の提供
ITLINE	データの変換・移行実務／新環境の構築・検証／リダイレクト設計／DNS切替のご案内・立会い
池上長寿園様	移行対象の要否ご判断／PDF元データのご提供（保有分）／検証環境のご確認／DNS変更操作・切替日時のご承認

現行環境の保守元がそのままリニューアルを担当するため、他社への引き継ぎ・情報照会の期間が発生しません。
